

Gestão de Projetos

2 - Acompanhamento do Projeto

Ciclo de vida do Projeto

O ciclo de vida de um projeto é uma estrutura conceitual que **descreve as fases pelas quais um projeto passa, desde o seu início até a sua conclusão**. Ele representa as etapas distintas que são necessárias para gerenciar um projeto de forma eficaz desde o planejamento inicial até o encerramento final.

Três tipos de ciclo: **preditivo, incremental e adaptativo**.

Ciclo de vida do Projeto

- **Ciclo preditivo:**
 - Escopo perfeitamente detalhado;
 - prescrito do início ao fim do projeto;
 - As entregas são definidas com muita antecedência;
 - Garante a previsibilidade do projeto;
 - Menor incerteza quanto às demandas;
 - **Mudanças sofrem com a burocracia e resistência;**



Escopo fixo

Requisitos definidos previamente em um plano detalhado.

Mudanças são limitadas.


Incertezas se acomodam nos custos e prazos.

Impulsionado pelo
planejamento

Ciclo de vida do Projeto

- **Ciclo incremental:**
 - As entregas acontecem por meio de múltiplas interações;
 - Adiciona novas funcionalidades a cada interação;
 - Admite certa flexibilidade quanto às alterações;
 - Custo e prazo são definidos de forma cíclica;
 - Preocupação somente com a demanda do momento.

Funcionalidades e características do Projeto

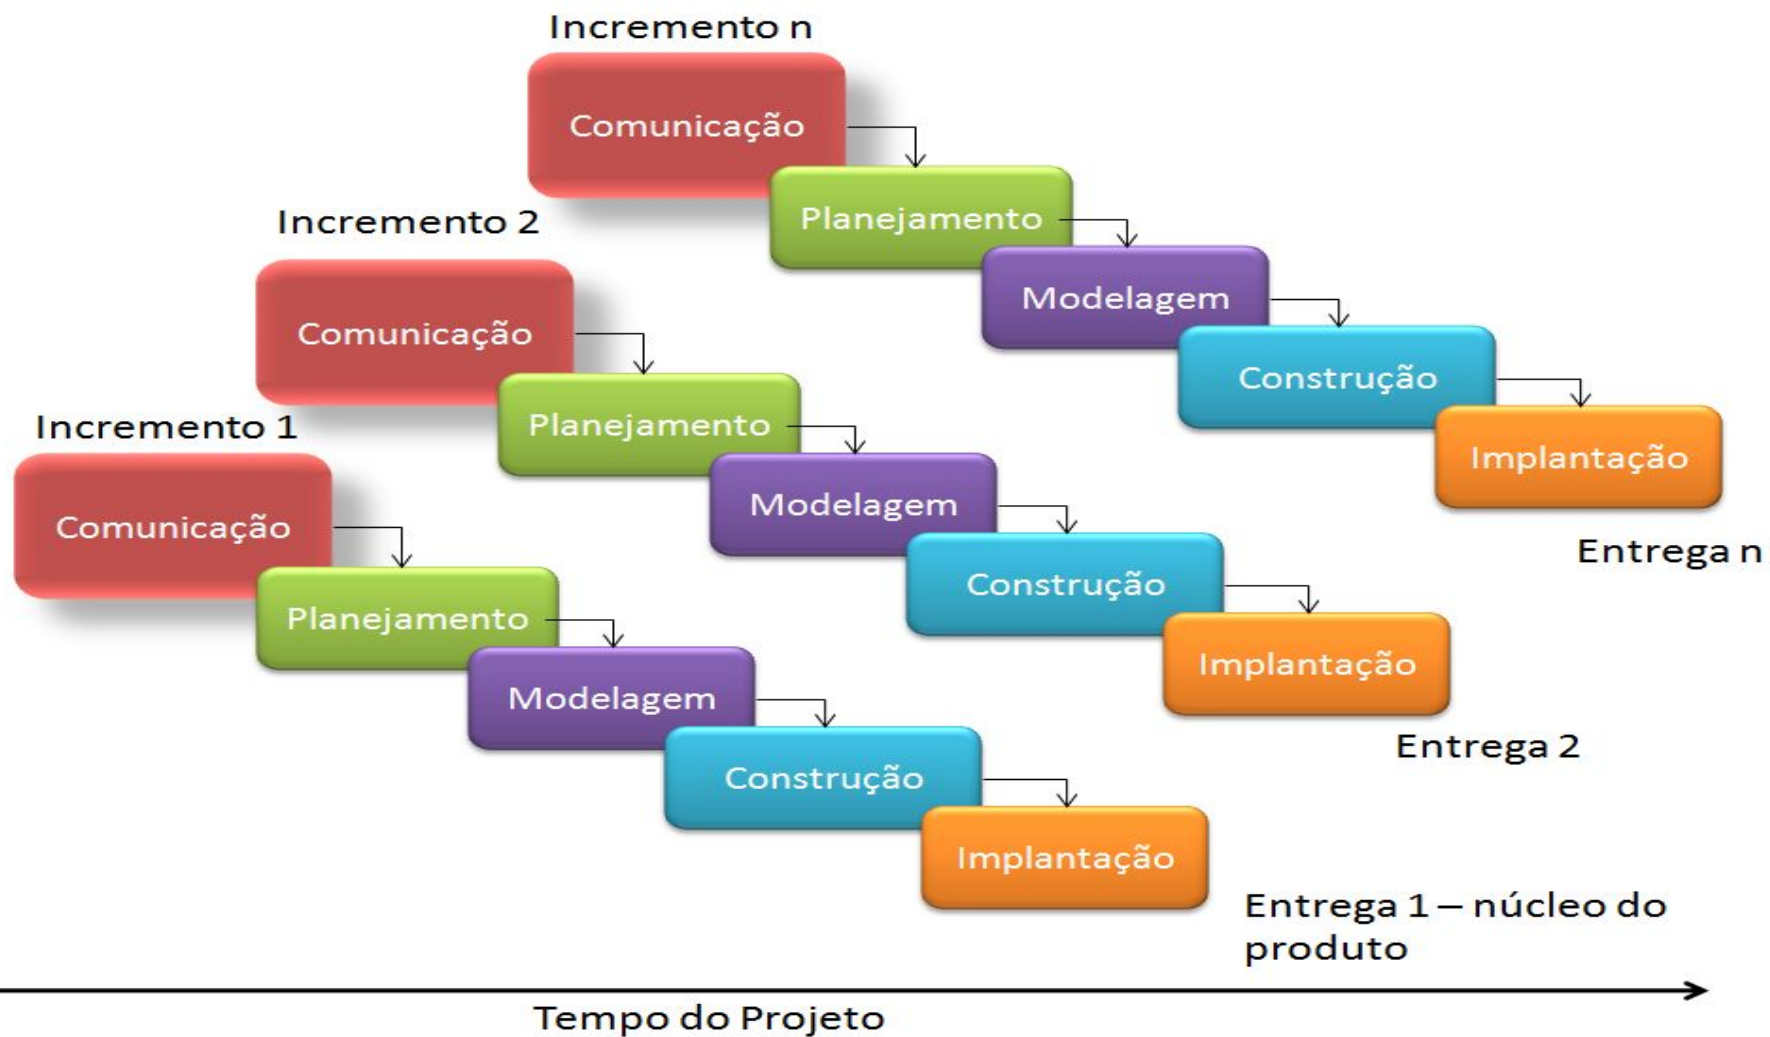

Tempo do Projeto

Ciclo de vida do Projeto

- **Ciclo adaptativo/ágil:**
 - Variáveis como escopo e tempo não estão claras;
 - As atividades são definidas sob demanda ou necessidade do momento;
 - Planejamento é adaptado a cada entrega;
 - Escopo são discutidos a qualquer momento;
 - Prevê mudanças a qualquer momento;
 - Associado às metodologias ágeis: XP, Scrum, etc.

Impulsionado pelo
valor


Custo e prazo
controlados.
Mudanças são
incorporadas nas
várias entregas.

Escopo flexível
Requisitos definidos
progresivamente.



Grupo mínimo de fases do projeto

A execução de um projeto pode ser dividida em múltiplas fases, havendo necessidade de existir fases de planejamento e execução do projeto. Na gestão de projetos, existe um grupo de fases mínimas que um projeto precisa seguir, de acordo com as metodologias de gerenciamento de projetos existentes no mercado.

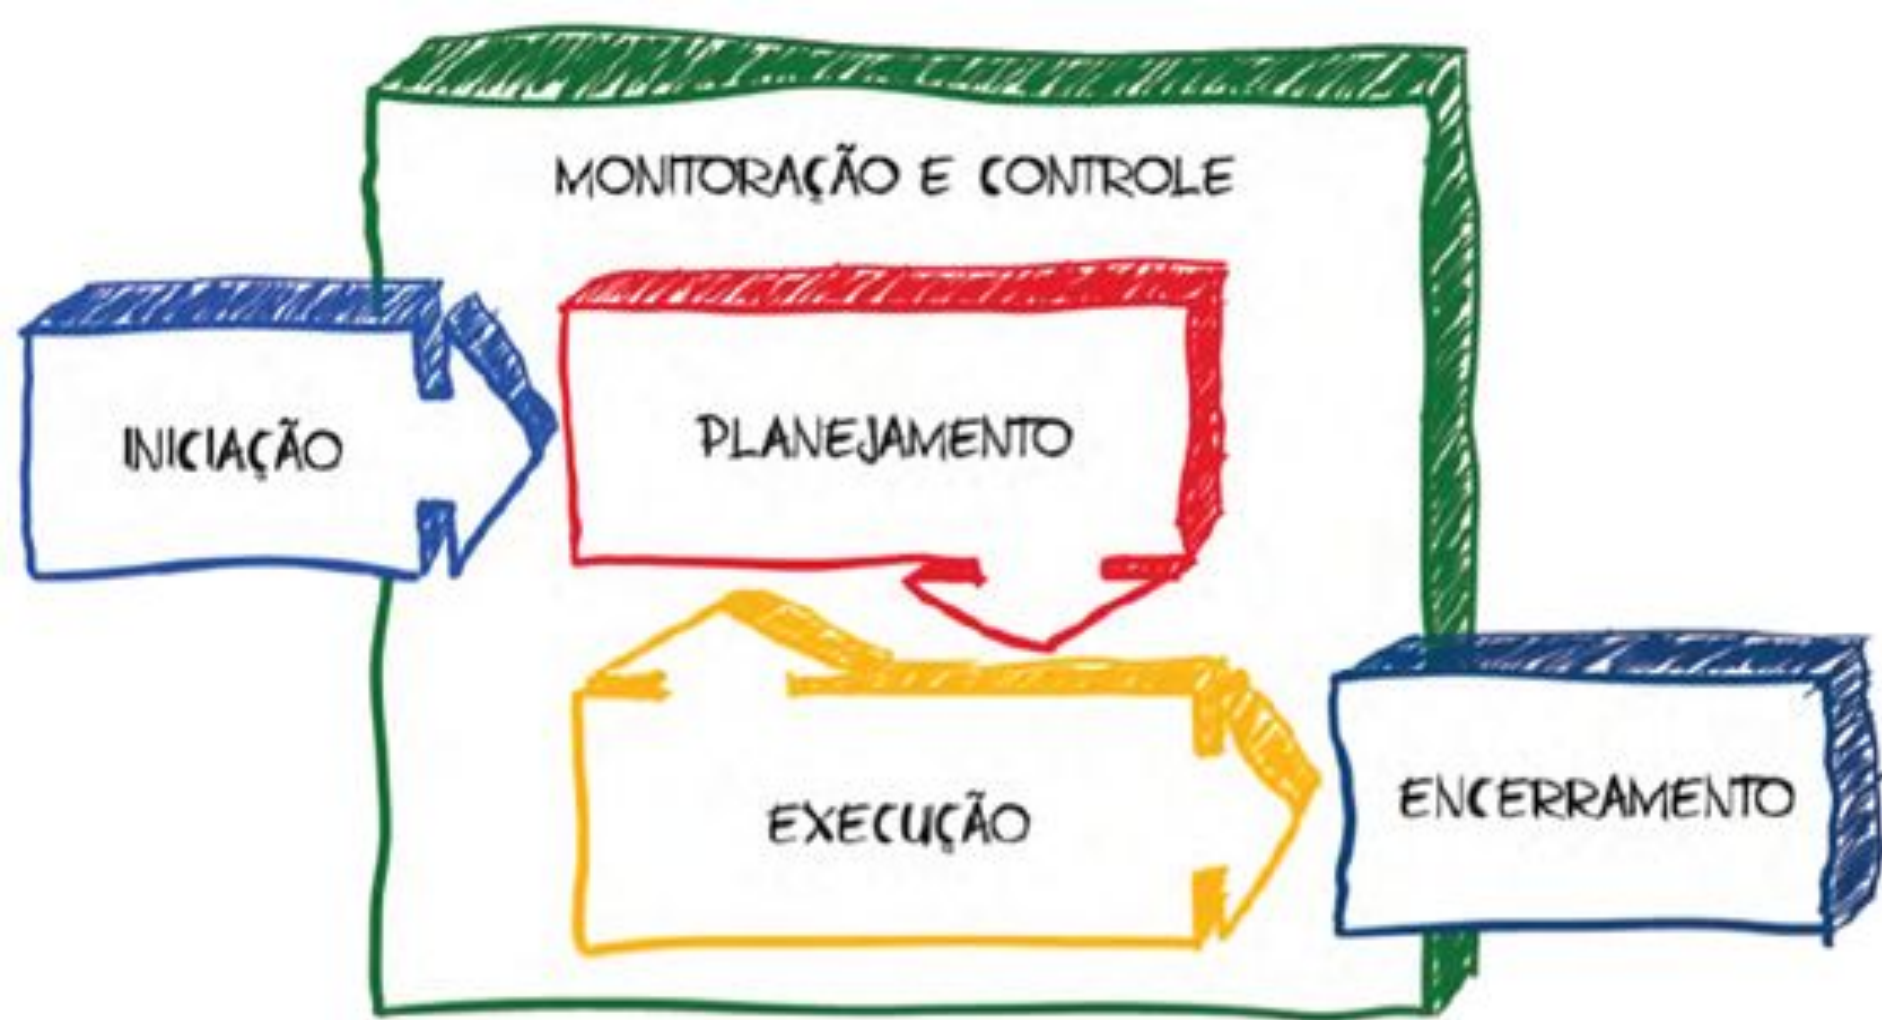

Grupo mínimo de fases do projeto

- **Início do projeto:**
 - Fase em que é definido o Termo de abertura (TAP) ou *project charter*;
 - Decisão de processos, ferramentas, entradas e saídas;
 - Ferramentas de gestão a serem utilizadas;
 - Formaliza a existência do projeto;
 - Não é o projeto em si, apenas o detalhamento das informações cruciais para o início do projeto.

Grupo mínimo de fases do projeto

4.1

INTEGRAÇÃO

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

ENTRADAS

1. Documentos de negócios
2. Acordos
3. Fatores ambientais da empresa
4. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. Opinião especializada
2. Coleta de dados
3. Habilidades interpessoais e de equipe
4. Reuniões

SAÍDAS

1. Termo de abertura do projeto
2. Registro de premissas

Grupo mínimo de fases do projeto

- **Organização e Preparação:**
 - Fase de planejamento do projeto;
 - Definição de cronograma de atividades;
 - Definição dos aportes financeiros;
 - Análise de custo;
 - Precisão de entregas;
 - O monitoramento e controle começa nessa fase.

Grupo mínimo de fases do projeto

- **Execução do trabalho:**
 - Fase que consome maior parte do tempo e recursos empregados no projeto;
 - Pode ser intercalada com a fase de planejamento, de acordo com o tipo de ciclo de vida;
 - Problemas podem ser corrigidos ao final dessa fase antes de retornar ao planejamento.
 - O monitoramento e controle também acontece nessa fase.



Grupo mínimo de fases do projeto

- **Encerramento do projeto:**
 - Última etapa a ser executada;
 - Recursos alocados começam a diminuir;
 - Produto deve ser entregue ao destinatário;
 - Documentos de formalização do encerramento do projeto;
 - Retrospectiva dos erros e acertos;
 - Armazenamento das informações no escritório de projetos da empresa.

Lições aprendidas por Área de Conhecimento

Área	Lições positivas O que deu certo?	Lições negativas O que deu errado?
Escopo		
Tempo		
Custo		
Qualidade		
Aquisições		
RH		
Comunicação		
Riscos		
Partes Interessadas		
Integração		

Relação sequencial e sobreposta

Embora um projeto tenha quatro grandes fases bem definidas, nada impede que sua estrutura possa ter mais do que essas quatro fases. Com múltiplas fases que um projeto possa ter, **há dois tipos de relação entre as fases do projeto: a relação sequencial e a relação sobreposta.** As relações determinam como as fases do projeto podem acontecer, algo que pode impactar definitivamente no resultado final do projeto.

Relação sequencial e sobreposta

- **Relação sequencial:**
 - Uma fase é dependente da outra;
 - A fase atual só pôde ser executada após ter esperado a fase anterior ter sido finalizada.
 - Reduz incertezas no projeto;
 - Projeto se limita a executar uma etapa de cada vez.

Relação sequencial e sobreposta

Uma abordagem de limpeza de um local dos resíduos perigosos




Relação sequencial e sobreposta

- **Relação sobreposta:**
 - Uma fase pode ser iniciada antes mesmo da anterior finalizar;
 - Paralelismo de atividades importantes no projeto;
 - Aumento considerável de gastos e recursos no projeto;
 - Aumento de incertezas e riscos;
 - Necessidade de comunicação constante.

Relação sequencial e sobreposta


Abordagem potencial para construir uma nova fábrica

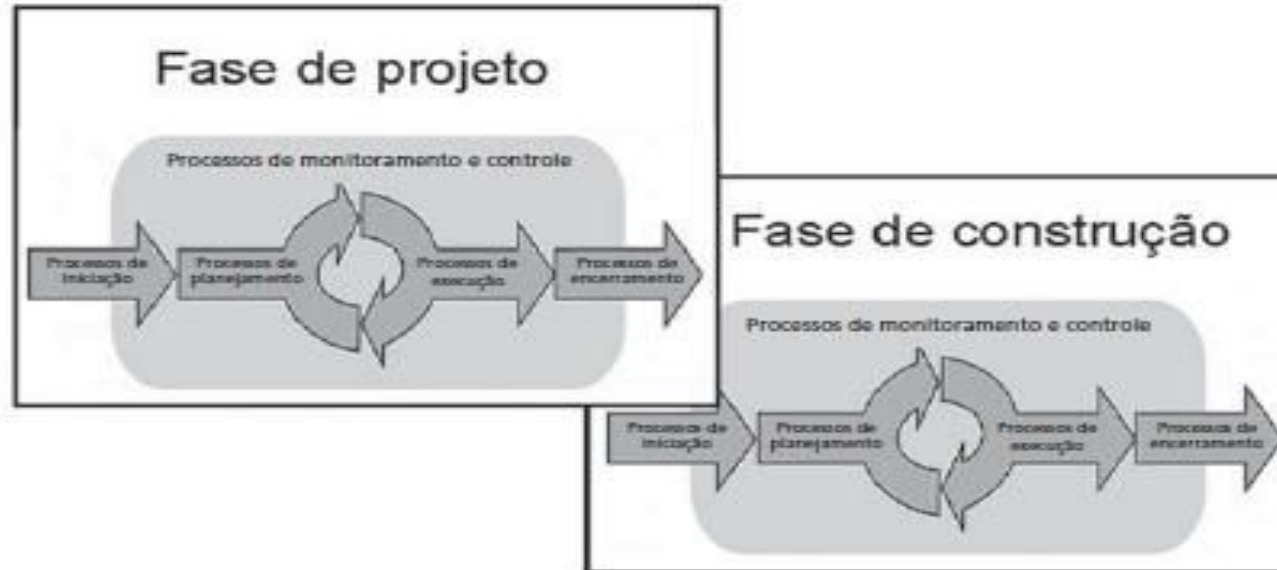

Linhas de base/Restrição Tripla

A execução do projeto se fundamenta em três pilares, isto é, três linhas de base que servirão de parâmetro para medir e acompanhar o progresso do projeto. As linhas de base são o **Cronograma** - ou tempo -, o **Escopo** e o **Custo**.

Linhas de base/Restrição Tripla

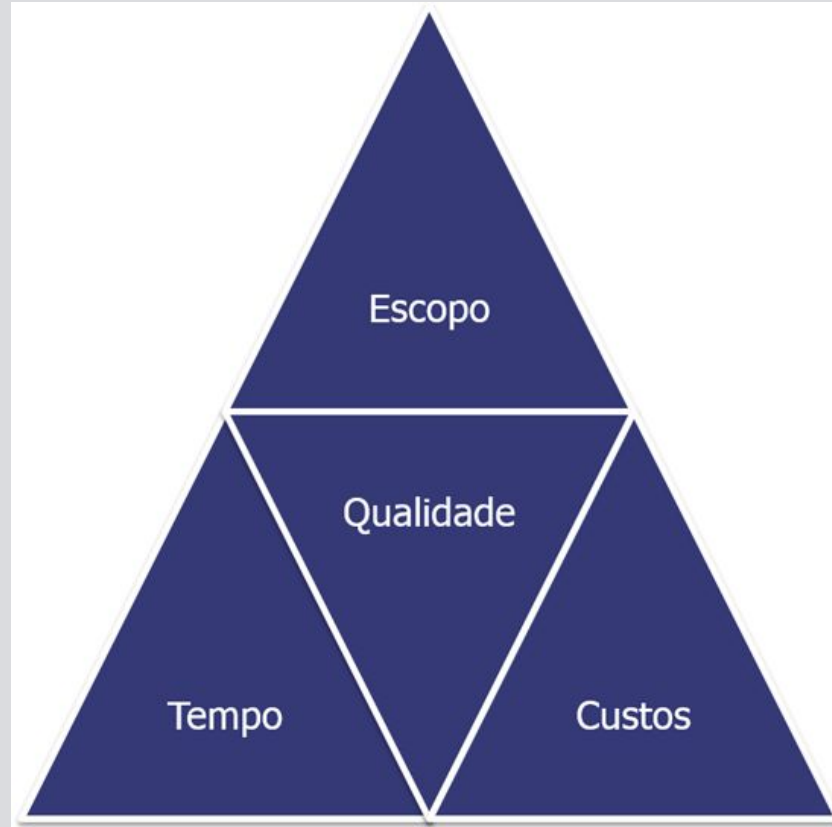

Linhas de base/Restrição Tripla



Riscos, incertezas e ameaças

Todo projeto possui riscos, incertezas e ameaças, ainda que em grau moderado, mas tem. É impossível prever todas as intercorrências de um projeto, pois, como qualquer investimento, um projeto também possui incertezas, sejam causadas por fatores internos ou externos.

Riscos, incertezas e ameaças

- ✓ Impossível reduzir riscos a zero, mas é possível mitigá-los;
- ✓ Reduzir riscos até que possamos controlá-los;
- ✓ Necessidade de conhecimento de gestão de riscos;
- ✓ Evitar incertezas no projeto por fatores internos ou externos;
- ✓ Uso de mapas de calor, ou Heatmaps, para rastrear os riscos do projeto, de acordo com o impacto e a probabilidade de acontecerem.

Impacto

Alto

Médio

Baixo

Baixo

Médio

Alto

Probabilidade





fb.com/faculdade.vinct



linkedin.com/school/faculdade_vinct



instagram.com/faculdade_vinct
