


Gestão de Projetos

3 - O Guia PMBOK®



O que é o Guia PMBOK®?

O PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) é um guia de boas práticas utilizado no gerenciamento de projetos. Ele foi desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI) e é amplamente reconhecido como um padrão na área de gerenciamento de projetos.

O PMBOK® descreve um conjunto de processos, ferramentas e técnicas que são consideradas as melhores práticas na gestão de projetos. Essas práticas abrangem desde o início até o encerramento de um projeto, incluindo a definição de escopo, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento do projeto.



O que é o Guia PMBOK®?

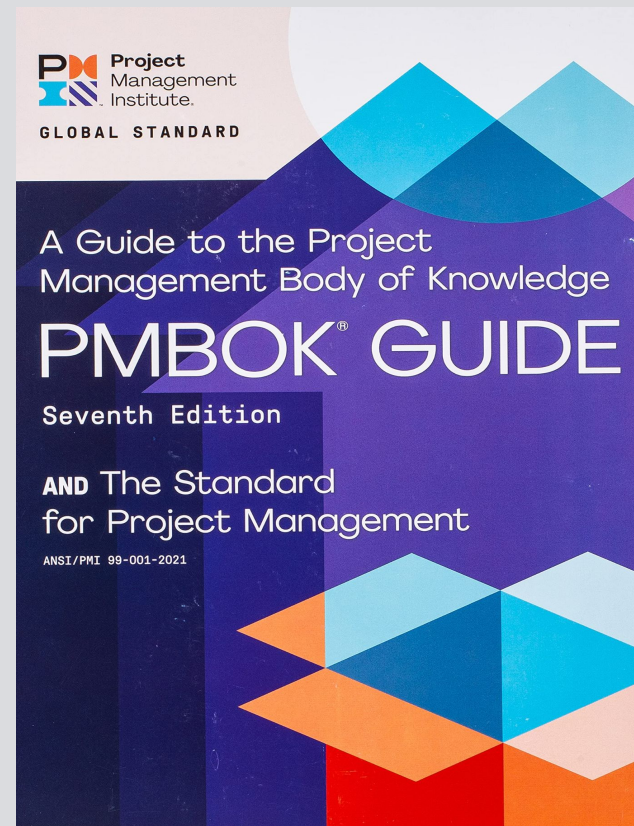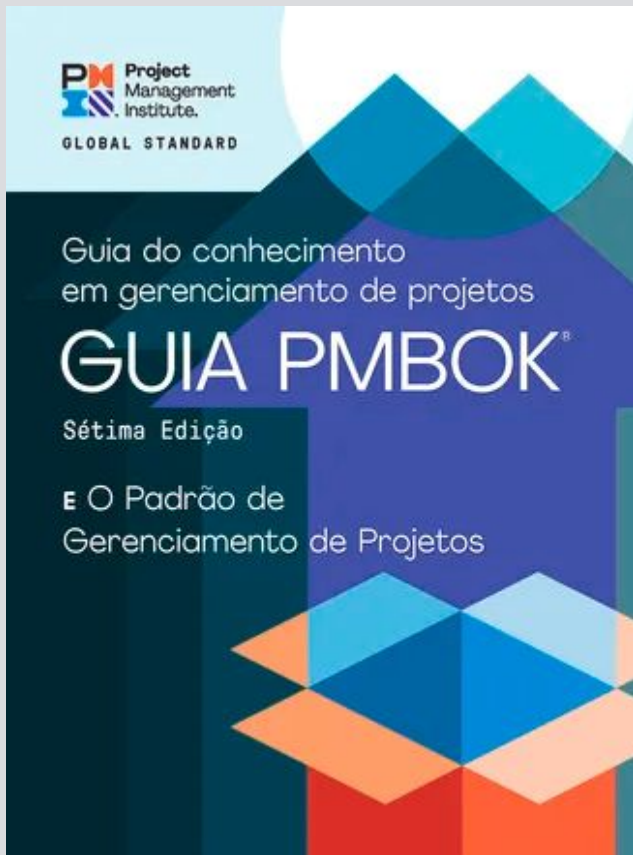

Gerente de Projetos

O Guia PMBOK® está centrado na figura principal do Gerente de Projetos. É a ele que interessa as dez áreas do conhecimento do guia, devendo compreender os processos do gerenciamento, que servirão de postulados para a gestão de projetos e assim alcançar o sucesso do projeto.

Gerente de Projetos

Como já mencionado, o Guia PMBOK® não é uma sequência de procedimentos que devem ser realizados na sequência para gerir um projeto, mas um conjunto de fundamentos que devem ser seguidos quando o gerente analisa as fases de execução do projeto. O PMBOK® é baseado em princípios, mais precisamente 12, porém não são citados explicitamente no Guia. São eles:

Princípios do Guia PMBOK®

- Orientação ao Cliente
- Orientação a Objetivos
- Gestão Integrada
- Enfoque em Valor
- Liderança Eficaz
- Envolvimento dos Stakeholders
- Gerenciamento de Mudanças
- Gerenciamento de Riscos
- Aprendizado Contínuo
- Abordagem Baseada em Processos
- Ética e Responsabilidade Profissional

Componentes do Guia PMBOK®

O Guia PMBOK postula seus princípios em **49 processos**, **divididos em 5 grandes grupos e 10 áreas de conhecimento**. Os **grupos** estão associados às fases mínimas de execução do projeto, isto é, **Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento**. Já as **10 áreas de conhecimento** fazem parte do arcabouço de conhecimento que o gerente de projetos deve possuir para orquestrar a gestão de um projeto.

Legenda

Integração

Escopo

Cronograma

Custos

Qualidade

Recursos

Comunicações

Riscos

Aquisições

Stakeholders

Inicição

4.1 - Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

13.1 - Identificar as Partes Interessadas

Encerramento

4.7 - Encerrar o Projeto ou Fase

Planejamento

5.1 - Planejar o Gerenciamento do Escopo

5.2 - Coletar os Requisitos

5.3 - Definir o Escopo

5.4 - Criar a EAP

9.1 - Planejar o Gerenciamento dos Recursos

9.2 - Estimar os Recursos das Atividades

6.1 - Planejar o Gerenciamento do Cronograma

6.3 - Sequenciar as Atividades

12.1 - Planejar o Gerenciamento das Aquisições

10.1 - Planejar o Gerenciamento das Comunicações

11.1 - Planejar o Gerenciamento dos Riscos

11.3 - Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos

6.2 - Definir as Atividades

6.4 - Estimar as Durações das Atividades

8.1 - Planejar o Gerenciamento da Qualidade

13.2 - Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

11.2 - Identificar os Riscos

11.4 - Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos

6.5 - Desenvolver o Cronograma

7.1 - Planejar o Gerenciamento dos Custos

7.2 - Estimar os Custos

7.3 - Determinar o Orçamento

4.2 - Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

11.5 - Planejar as Respostas aos Riscos

Monitoramento e Controle

3.5 - Validar o Escopo

3.6 - Controlar o Escopo

13.4 - Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas

11.7 - Monitorar os Riscos

4.5 - Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

4.6 - Realizar o Controle Integrado das Mudanças

7.4 - Controlar os Custos

8.3 - Controlar a Qualidade

9.6 - Controlar os Recursos

10.3 - Monitorar as Comunicações

12.3 - Controlar as Aquisições

6.6 - Controlar o Cronograma

24 processos

Execução

9.3 - Adquirir os Recursos

8.2 - Gerenciar a Qualidade

4.3 - Orientar e Gerenciar o Trabalho da Equipe

13.3 - Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

12.2 - Conduzir as Aquisições

9.4 - Desenvolver a Equipe

9.5 - Gerenciar a Equipe

4.4 - Gerenciar o Conhecimento do Projeto

10.2 - Gerenciar as Comunicações

11.6 - Implementar Respostas a Riscos

10 processos

2 processos

1 processo

12 processos

Processos do Guia PMBOK®

Os **49 processos** do PMBOK® foram enumerados de acordo com as áreas de conhecimento a qual pertencem, **partindo de 4.1 até 13.3**. Note que **a numeração dos processos já inicia em 4**, sendo que o número que antecede o ponto é o capítulo do **PMBOK®** referente à área de conhecimento em questão, e o número após o ponto é a sequência ou ordem em que o **processo** está listado no Guia.

Processos do Guia PMBOK®

- Os processos estão divididos em:
 - Grupos de processos, ou fases do projeto;
 - Áreas de conhecimento;

Grupo de processos do Guia PMBOK®

- Processos de Inicialização:

O grupo de inicialização é o responsável por especificar as atividades iniciais do projeto. Possui apenas dois processos relacionados, sendo o “4.1 - Desenvolver o termo de Abertura do Projeto” e o “13.1 - Identificar as partes interessadas”.

Grupo de processos do Guia PMBOK®

- Processos de planejamento:

O grupo de Planejamento, com 24 processos relacionados, é o mais detalhado de todos os grupos. Todos os seus processos são importantes, porém, se destacam alguns, como “5.2 - Coletar os requisitos”, “5.3 - Definir o escopo”, “5.4 - Criar a EAP - Estrutura Analítica do Projeto”, além de atividades relacionadas ao cronograma de atividades, gerenciamento de custos e riscos do projeto.

Grupo de processos do Guia PMBOK®

- Processos de execução:

Com 10 processos de gerenciamento, a fase de execução se desdobra naqueles que levarão mais tempo, recursos e esforços do projeto. A garantia da qualidade, desenvolvimento da equipe, gerenciamento das aquisições, dos riscos e das partes interessadas (stakeholders) são processos que fazem parte deste grupo.

Grupo de processos do Guia PMBOK®

- Processos de monitoramento e controle:

O grupo de Monitoramento e controle não necessariamente é uma fase de execução do projeto e não foi citado textualmente no capítulo anterior. Seus 12 processos são executados durante as fases de planejamento e execução, monitorando, controlando e validando uma série de questões do projeto, como riscos, escopo, partes interessadas e o trabalho executado, além da comunicação interna e externa do projeto.

Grupo de processos do Guia PMBOK®

- Processos de encerramento:

O grupo de Encerramento possui um único processo, o “4.7 - Encerrar o Projeto ou Fase”, que faz parte da mesma área de conhecimento do primeiro processo do grupo Inicialização, o “4.1 - Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto”. O processo 4.7 está dedicado em desempenhar esforços para coletar dados e elaborar documentos para encerramento do projeto, que serão armazenados e servirão de base de conhecimento no futuro para novos projetos.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

4. Integração
5. Escopo
6. Prazo
7. Custos
8. Qualidade
9. Recursos Humanos
10. Comunicações
11. Riscos
12. Aquisições
13. Partes interessadas

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

4. Integração

Contém apenas dois dos 49 processos, sendo o “4.1 - Desenvolvimento do Termo de Abertura” e o “4.7 - Encerramento do projeto ou da fase de execução”. A área de Integração possui este nome pois é a responsável por integrar todas as demais áreas do conhecimento.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

5. Escopo

Os processos da área de conhecimento do Escopo concentram-se nos grupos de planejamento e monitoramento e controle. Esses processos dizem respeito à coleta e definição de requisitos, criação da EAP (Estrutura Analítica de Projetos), além da validação e controle de escopo.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

6. Prazo

A área de conhecimento Prazo, ou Cronograma, concentra seis dos 49 processos, cujo objetivo é o controle e sequenciamento e tempo de duração das atividades. Cinco dos seis processos da área de conhecimento estão no grupo de planejamento, já que o prazo é fundamentalmente uma variável a ser controlada durante essa fase, e não no momento da execução das atividades.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

7. Custos

A área de conhecimento do Custo é importantíssima ao gerente de projetos. Possui apenas três processos relacionados à essa linha de base da restrição tripla. O objetivo é a estimativa e controle dos custos, junto a elaboração do orçamento do projeto.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

8. Qualidade

A área de conhecimento da Qualidade contém os processos voltados ao planejamento e garantia da qualidade. São apenas três processos de três diferentes grupos: Planejamento, Execução e Monitoramento e Controle, e a descrição dos processos é intuitiva quanto aos grupos que compõem: Planejar, executar e controlar a qualidade do projeto.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

9. Recursos Humanos

Os Recursos Humanos é a área de conhecimento do gerente de projetos voltado à gestão dos colaboradores e da equipe como um todo. O gerente precisa lidar com os aspectos comportamentais e subjetivos dos integrantes do projeto, por isso é papel dele executar os processos de contratação, desenvolvimento e gerenciamento da equipe.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

10. Comunicações

Outra área de conhecimento do gerente de projetos é a Comunicação. Além de planejar e gerenciar a comunicação do projeto, seja interna ou externa, o gerente precisa ser um vetor de informações, isto é, distribuir as informações a todos que se interessarem. A falta de comunicação aumenta as incertezas e os riscos de projetos.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

11. Riscos

Os processos da área de conhecimento de Riscos estão voltados, predominantemente, para o Planejamento e Monitoramento e Controle. São 6 processos divididos nestes dois grupos voltados ao planejamento, identificação e análise de riscos, além do controle que deve ser realizado a fim de mitigar os riscos durante a execução do projeto.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

12. Aquisições

A área de conhecimento de Aquisições possui um processo em cada um dos grupos, exceto no de inicialização. São quatro processos voltados ao planejamento, execução, controle e encerramento das aquisições.

Áreas de conhecimento do Guia PMBOK®

13. Partes Interessadas

Por fim, a área de conhecimento das Partes Interessadas, ou Stakeholders, é aquela que possui processos voltados aos interessados do projeto, seus investidores, diretores, gerentes e destinatários. Possui quatro processos, sendo dois deles no grupo de Planejamento, um no grupo de execução e outro no grupo de Monitoramento e Controle. Os processos dessa área de conhecimento tratam da identificação, planejamento, gerenciamento e controle das partes envolvidas do projeto.



fb.com/faculdade.vinct



linkedin.com/school/faculdade_vinct



instagram.com/faculdade_vinct
