

Gestão de Projetos

8. PMO: Project Management Office

O que é um PMO?

PMO significa Project Management Office, ou Escritório de Gerenciamento de Projetos, sendo esta uma estrutura organizacional, uma espécie de departamento, que visa fazer a governança e gestão dos projetos. **O PMO promove a padronização dos processos e é o guardião das metodologias de gestão utilizadas nos projetos da empresa**, servindo de suporte aos gerentes e equipes de projetos, oferecendo-lhes consultoria e orientação sobre as metodologias e ferramentas utilizadas na gestão.

Tipos de PMO dentro de uma organização

- **PMO Corporativo/Estratégico:**


- Abrange todos os projetos de uma organização;
- Ligação forte com a parte estratégica;
- Gerencia o portfólio de projetos;
- Atua na priorização dos projetos para os executivos.

- **PMO departamental/Tático:**

- Define os padrões de gestão a serem adotados por um departamento ou área;
- Destinado ao apoio de vários projetos de uma mesma área;
- Desenvolve e implanta metodologias de gestão para serem aplicados em uma área;
- Prioriza projetos internos e gerentes de projetos departamentais.

- **PMO operacional:**

- Possui um tempo de funcionamento programado;
- Chamado de PMO autônomo ou Programa-Projeto;
- Aplicados em projetos com alta complexidade e nível elevado de importância, que requerem padrões específicos de gerenciamento.

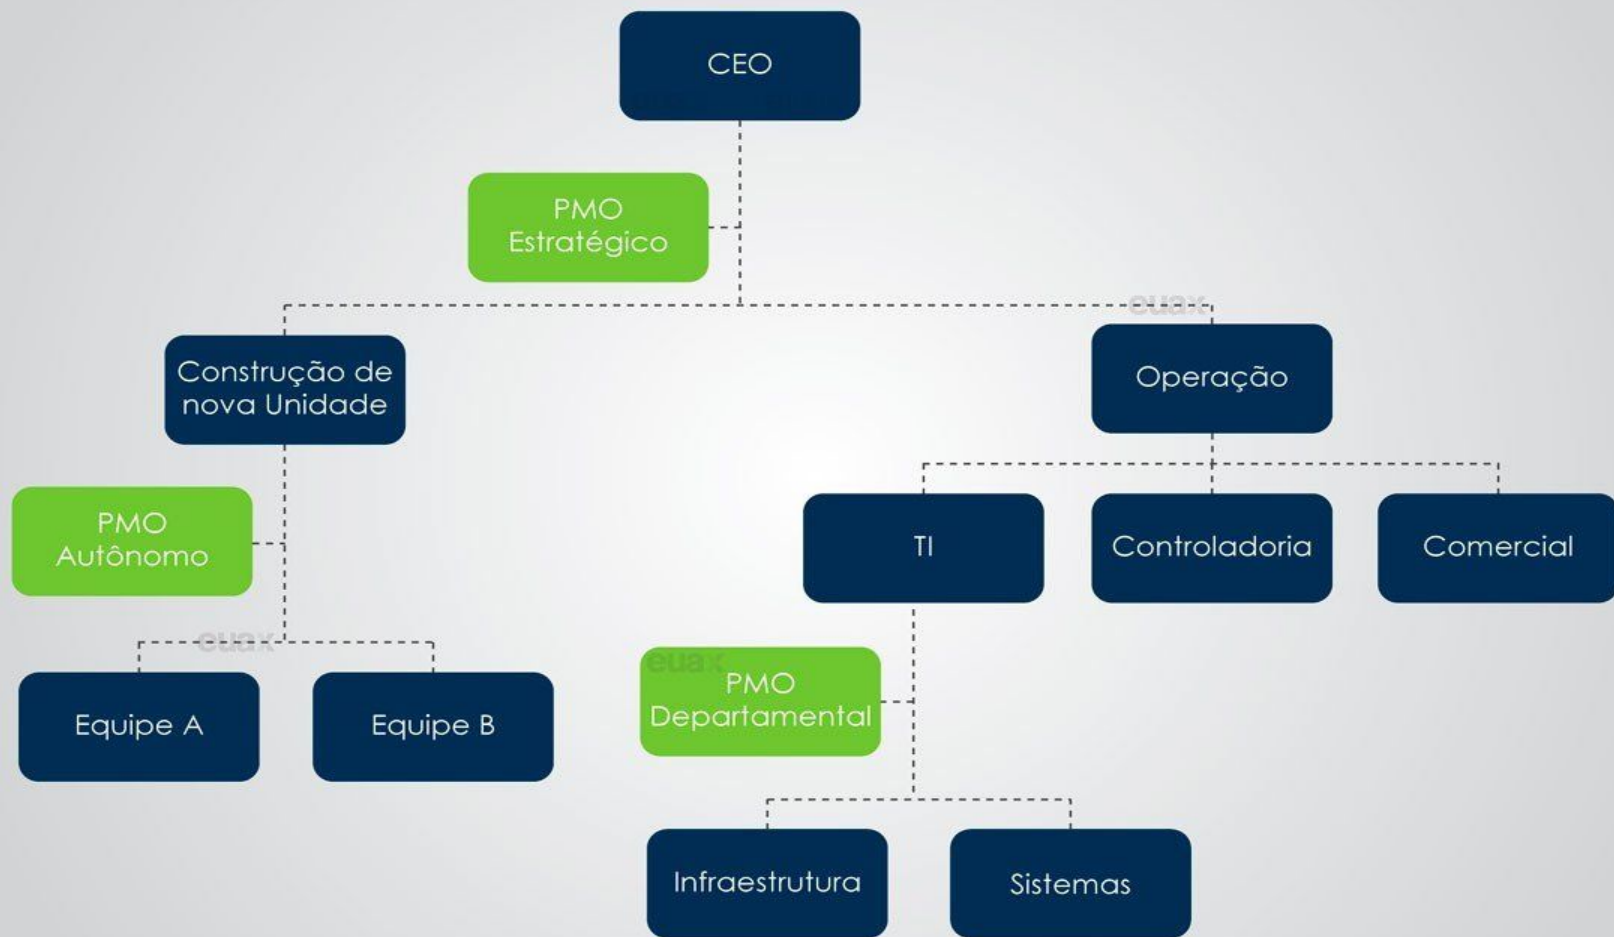

Responsabilidades gerais do PMO

É comum que projetos não atinjam algumas variáveis, como escopo, custo e tempo. Por isso, o PMO deve servir de suporte e ter o compromisso de, por exemplo, ajudar os gerentes de projeto para que tudo seja atendido dentro das linhas de restrição do projeto. Além disso, o PMO possui outras funções de apoio, como:

- ✓ Estruturação de relatório sobre o portfólio de projetos;
- ✓ Repasse do progresso;
- ✓ Gerenciamento do cronograma em nível de portfólio, além de recursos e riscos;
- ✓ Definir as metodologias a serem aplicadas;
- ✓ Desenvolver melhorias nos processos de gestão e gerenciamento de projeto;
- ✓ Determinação de métricas e estimativas;
- ✓ Distribuição de informações e facilitação da comunicação entre os tipos;
- ✓ Compartilhamento de recursos.

Responsabilidades gerais do PMO

Por ser um departamento centralizador das metodologias de gestão, um PMO tem por responsabilidades:

- ✓ Coordenação de esforços para que as estratégias sejam alcançadas;
- ✓ Melhoria dos recursos compartilhados entre todos os projetos da empresa;
- ✓ Disponibilização de informações a respeito dos projetos sob seu controle;
- ✓ Suporte metodológico aos gerentes de projetos.

O profissional do PMO

A sigla PMO também pode significar **Project Manager Officer**, ou Diretor de Gerenciamento de Projetos. É um cargo de alto nível em uma organização que concentra o gerenciamento estratégico e supervisão de todos os projetos em andamento. Suas atribuições são:

- ✓ Desempenha papel fundamental no estabelecimento da cultura do gerenciamento de projetos;
- ✓ Desenvolve e estabelece estratégias de gerenciamento de projetos de uma organização;
- ✓ Estabelece e mantém a governança dos projetos;
- ✓ Define programa de treinamentos para gerente de projetos e membros da equipe
- ✓ Monitora os relatórios de gerenciamento de projetos, analisando progresso, desempenho, tomando medidas para intervenção quando há intercorrências.
- ✓ Promove a melhoria contínua, buscando constantemente formas de melhorar o processo de gerenciamento de projetos.

O profissional do PMO

A sigla PMO também pode significar **Project Manager Officer**, ou Diretor de Gerenciamento de Projetos. É um cargo de alto nível em uma organização que concentra o gerenciamento estratégico e supervisão de todos os projetos em andamento. Suas atribuições são:

- ✓ Desempenha papel fundamental no estabelecimento da cultura do gerenciamento de projetos;
- ✓ Desenvolve e estabelece estratégias de gerenciamento de projetos de uma organização;
- ✓ Estabelece e mantém a governança dos projetos;
- ✓ Define programa de treinamentos para gerente de projetos e membros da equipe
- ✓ Monitora os relatórios de gerenciamento de projetos, analisando progresso, desempenho, tomando medidas para intervenção quando há intercorrências.
- ✓ Promove a melhoria contínua, buscando constantemente formas de melhorar o processo de gerenciamento de projetos.


O profissional do PMO

A sigla PMO também pode significar **Project Manager Officer**, ou Diretor de Gerenciamento de Projetos. É um cargo de alto nível em uma organização que concentra o gerenciamento estratégico e supervisão de todos os projetos em andamento. Suas atribuições são:


- ✓ Desempenha papel fundamental no estabelecimento da cultura do gerenciamento de projetos;
- ✓ Desenvolve e estabelece estratégias de gerenciamento de projetos de uma organização;
- ✓ Estabelece e mantém a governança dos projetos;
- ✓ Define programa de treinamentos para gerente de projetos e membros da equipe
- ✓ Monitora os relatórios de gerenciamento de projetos, analisando progresso, desempenho, tomando medidas para intervenção quando há intercorrências.
- ✓ Promove a melhoria contínua, buscando constantemente formas de melhorar o processo de gerenciamento de projetos.

Vantagens do PMO para as organizações

DISTRIBUIÇÃO NOS NÍVEIS DE DESEMPENHO
Geral - 2017

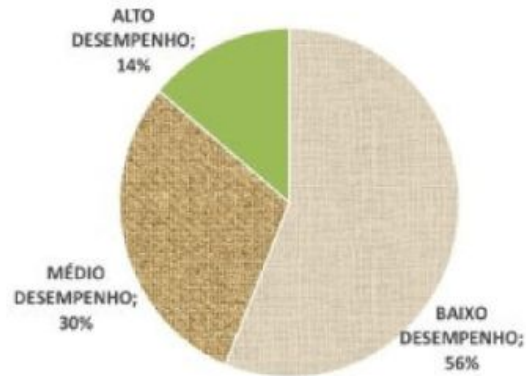

NÍVEL DE DESEMPENHO E SUCESSO
Geral - 2017

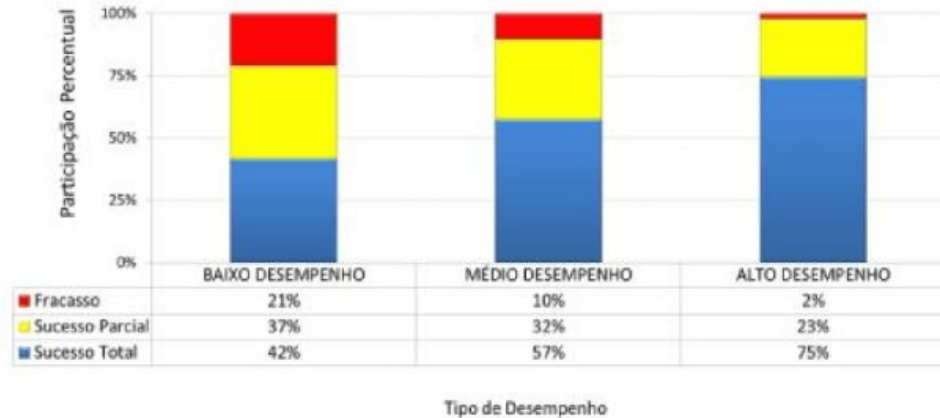

Vantagens do PMO para as organizações

Resultado	Empresas de alta maturidade	Empresas de baixa maturidade
Percentual médio de projetos completados dentro do prazo	88%	24%
Percentual médio de projetos completados dentro do orçamento	90%	25%
Percentual médio de projetos que alcançaram seus objetivos de negócio	92%	33%
Percentual médio de projetos com problemas de escopo	28%	68%
Percentual médio de projetos que falharam	6%	24%
Percentual médio do orçamento perdido com as falhas do projeto	14%	46%

O que é Priorização de Portfólio?

A priorização de portfólio refere-se ao processo de selecionar e classificar os projetos, programas ou iniciativas de uma organização com base em critérios específicos. É uma técnica utilizada para determinar quais projetos devem ser executados, quais devem ser adiados ou cancelados, e como os recursos da organização devem ser alocados de forma eficiente.

A priorização de portfólio envolve a análise e comparação de várias iniciativas com base em fatores como retorno sobre o investimento, alinhamento estratégico, riscos, recursos disponíveis, restrições orçamentárias, impacto nos objetivos da organização, entre outros.


Propostas de projetos
registrados

Projetos candidatos
em análise

Projetos candidatos
priorizados

Projetos em execução

Projetos candidatos
aprovados

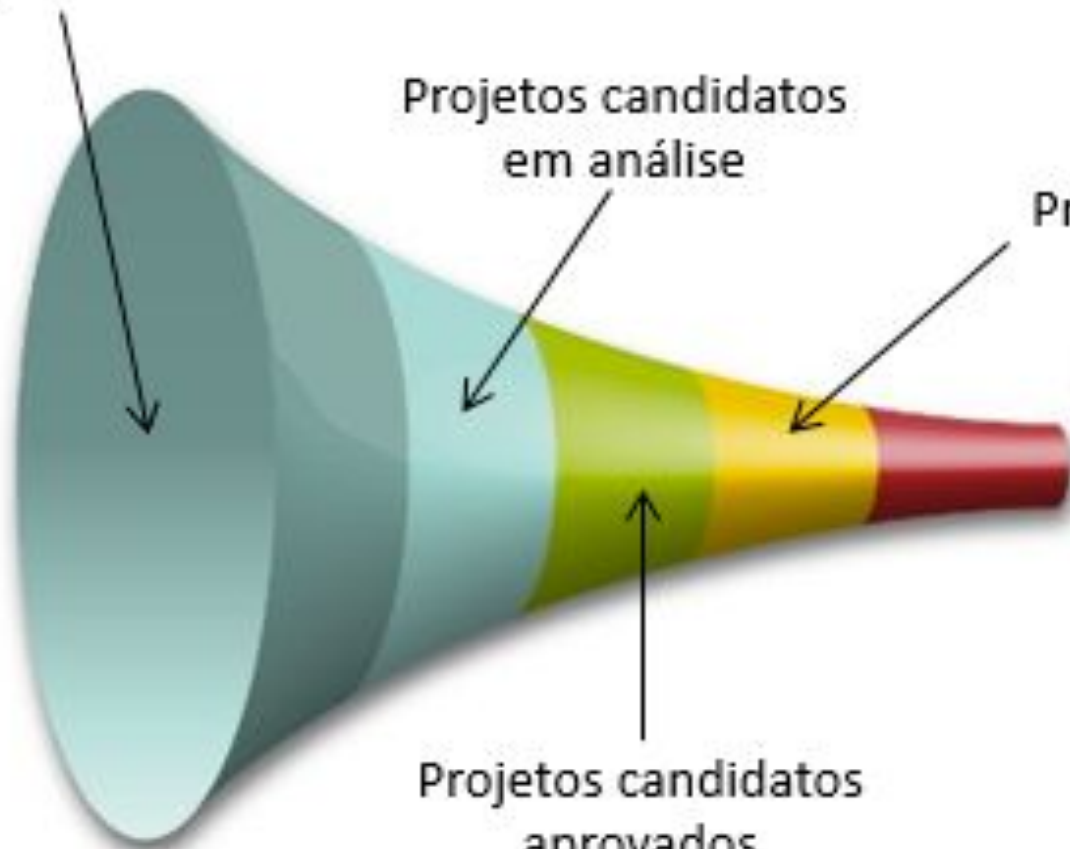

Técnicas de Priorização de Portfólio

Existem várias abordagens e técnicas para a priorização de portfólio, incluindo **matrizes de pontuação**, **análise de custo-benefício**, **análise de risco**, **técnicas de modelagem financeira** e análise de cenários. O processo de priorização pode variar de acordo com a natureza e os objetivos da organização, mas geralmente envolve a coleta de informações sobre os projetos ou iniciativas, a definição de critérios de priorização, a avaliação e classificação das opções e a tomada de decisões com base nos resultados.

Técnicas de Priorização de Portfólio

Indicadores de análise de viabilidade financeira:

- **TIR** - Taxa interna de retorno
- **VPL** - Valor Presente Líquido
- **Payback** - Tem de retorno do investimento

Indicadores de análise multicriterial:

- **AHP** - Analytic Hierarchy Process
- **ANP** - Analytic Network Process
- **TOPSIS** - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution



NOTA MÁXIMA DO MEC

**FACULDADE
VINCIT**

www.faculdadevincit.edu.br



fb.com/faculdade.vincit



linkedin.com/school/faculdade_vincit



instagram.com/faculdade_vincit
